Venta directa y venta a agencias: **dos plataformas propias para AVM**

B2C: un sitio donde el viajero busca, cotiza, reserva y paga. **B2B:** un portal propio, al estilo de Travel Compositor, donde las agencias reservan con los proveedores con los que AVM tiene negociación, con pago o con crédito de AVM. Tiempos calculados para un desarrollador, a 20 horas por semana, desde hoy.

RESUMEN

Cuatro escenarios, **con fecha real**

B2C · CAMINO 1

LiteAPI + producto propio

PRODUCTOS	Hoteles, vuelos y actividades de LiteAPI; asistencia médica y traslados propios
DURACIÓN	6 meses
EN PRODUCCIÓN	7 de mayo de 2027

B2C · CAMINO 2

Proveedores de AVM

PRODUCTOS	Hoteles, traslados y actividades de TBO, World2Meet y Omnibees; asistencia y traslados propios
DURACIÓN	8 meses
EN PRODUCCIÓN	16 de julio de 2027

RECOMENDADO SI AVM QUIERE AMBOS

B2C camino 2, luego B2B

DURACIÓN	14 meses
B2C EN PRODUCCIÓN	16 de julio de 2027
B2B EN PRODUCCIÓN	14 de enero de 2028

ALTERNATIVA

B2C camino 1, luego B2B

DURACIÓN	16 meses
B2C EN PRODUCCIÓN	7 de mayo de 2027
B2B EN PRODUCCIÓN	17 de marzo de 2028

Por qué el camino 2 si AVM quiere los dos proyectos: el B2B necesita los conectores de TBO, World2Meet y Omnibees. En el camino 2 se construyen una sola vez y el B2B los reutiliza. En el camino 1 el B2C sale dos meses antes, pero esos conectores se hacen después y el total es dos meses más largo.

PROYECTO 1 · B2C

El sitio para **el viajero**

Las dos opciones comparten el mismo sitio y el mismo backoffice. Cambia de dónde salen los precios y las reservas.

Buscador y cotización AVANZADO

Fechas en un paso, filtros, ficha del hotel con fotos por habitación y cotización con adicionales.

Reserva y pago en línea

El viajero reserva y paga con tarjeta, PSE o Nequi por la pasarela (Wompi, PayU o ePayco), con confirmación y voucher.

Cuentas de usuario

Registro e ingreso del viajero, sus reservas, sus cotizaciones y sus datos para la próxima compra.

Backoffice AVANZADO

Diseño y marca, banners, markup y fees por producto, producto y tarifarios propios, contenido y desglose de cada venta.

Gestión de reservas

Reservas, pagos, cancelaciones y reembolsos en el backoffice, con aviso al equipo y al viajero.

Asistencia médica y traslados

Producto propio cargado por AVM, con precio en la cotización y en la compra.

SEO AVANZADO

Página por destino, hotel y actividad, mapa del sitio y datos para Google.

Google Ads y Analytics

Google Analytics 4 y conversiones de Google Ads en búsqueda, cotización y compra.

Automatizaciones de marketing

Recaptura de búsquedas y cotizaciones sin compra, campañas a listas y baja automática.

1

6 MESES · 7 MAY 2027

Camino 1: LiteAPI + producto propio

- Hoteles, vuelos y actividades con precio y reserva de LiteAPI.
- Asistencia médica y traslados como producto propio de AVM.
- Aprovecha lo que ya está construido y probado con LiteAPI.

Requisito: LiteAPI debe aprobar los pagos de AVM en producción y habilitar Flights y Experiences en su cuenta.

2

8 MESES · 16 JUL 2027

Camino 2: proveedores de AVM

- Hoteles y actividades de TBO, hoteles y traslados de World2Meet, hoteles directos de Omnibees.
- Un mismo hotel de varios proveedores sale una sola vez, con el mejor precio.
- Asistencia médica y traslados propios, igual que en el camino 1.

Vuelos: ninguno de estos tres proveedores trae vuelos con lo que AVM tiene hoy. Se pueden sumar con LiteAPI Flights o TBO Air, con 3 a 4 semanas más.

PROYECTO 2 · B2B

El portal para **las agencias**

Un portal propio de AVM, al estilo de Travel Compositor: las agencias aliadas reservan con los proveedores con los que AVM tiene negociación, ven su precio neto y su comisión, y pagan con tarjeta o con el crédito que AVM les asigna.

Registro de agencias

Solicitud con RNT y NIT, aprobación de AVM, usuarios por agencia con roles (administrador y asesor).

Precios por agencia

Markup y comisión por agencia o por grupo de agencias, por producto y por proveedor.

Crédito de AVM

Cupo o saldo prepagado por agencia, movimientos, estado de cuenta, abonos, alertas y bloqueo por mora.

Conectores de proveedores

TBO, World2Meet y Omnibees: búsqueda, precio, reserva, cancelación y voucher.

Expedientes

Varios servicios en un mismo viaje (hotel, vuelo, traslado, actividad, asistencia) con un solo voucher.

Vuelos y asistencia médica

Vuelos con el proveedor aéreo que AVM elija y asistencia médica con la API de su proveedor.

Pago con tarjeta

La misma pasarela del B2C, para agencias que no usan crédito.

Operación en el backoffice

Reservas por agencia, cancelaciones, reportes de venta por agencia y proveedor, conciliación con proveedores.

Lo del B2C

Diseño, banners, markup, producto propio, usuarios, correos y desglose de cada venta.

HORAS DE DESARROLLO

De dónde salen **los meses**

Estimación de un desarrollador. Cada total lleva un 20 % de margen para imprevistos: cambios de los proveedores, certificaciones y ajustes después de las pruebas.


TRABAJO	CAMINO 1	CAMINO 2
Salida a producción de lo construido Backoffice, tarifarios, marca, integraciones	20 h	20 h
Pasarela de pagos Pago, confirmación automática, reembolsos y conciliación	40 h	40 h
Reserva de hoteles con LiteAPI	40 h	-
Vuelos con reserva (LiteAPI) Datos de pasajeros, emisión y cambios	50 h	-
Actividades con reserva (LiteAPI)	30 h	-
Conector TBO Hoteles y actividades: búsqueda, reserva, cancelación y certificación	-	100 h
Conector World2Meet Hoteles y traslados	-	70 h
Conector Omnibees Hoteles directos	-	60 h
Hoteles repetidos entre proveedores Unificar un mismo hotel y su contenido	-	60 h
Cuentas de usuario	35 h	35 h
Gestión de reservas, vouchers y correos	45 h	45 h
Asistencia médica y traslados propios en la compra	10 h	10 h
Banners y diseño parametrizable	15 h	15 h
Google Analytics 4 y Google Ads	15 h	15 h
Automatizaciones de marketing	25 h	25 h
Pruebas de punta a punta, seguridad y capacitación	50 h	70 h
Subtotal	**375 h**	**565 h**
Margen para imprevistos (20 %)	75 h	115 h
Total B2C	**450 h · 6 meses**	**680 h · 8 meses**

TRABAJO B2B	DESPUÉS DEL CAMINO 1	DESPUÉS DEL CAMINO 2
Conectores TBO, World2Meet y Omnibees y hoteles repetidos	290 h	Ya hechos
Registro de agencias, usuarios y roles	40 h	40 h
Precios y comisiones por agencia	30 h	30 h
Crédito de AVM a las agencias	60 h	60 h
Expedientes de varios servicios y vouchers	70 h	70 h
Vuelos y asistencia médica por API	60 h	60 h
Operación, reportes y conciliación	50 h	50 h
Pago con tarjeta para agencias	15 h	15 h
Pruebas, certificaciones y capacitación	70 h	70 h
Subtotal	**685 h**	**395 h**
Margen para imprevistos (20 %)	140 h	80 h
Total B2B	**825 h · 10 meses**	**475 h · 6 meses**

A 20 horas por semana salen unas 80 horas útiles al mes. Los meses incluyen el descanso del 21 de diciembre al 1 de enero de cada año.

CRONOGRAMA RECOMENDADO

B2C camino 2 y luego B2B · **9 nov 2026 a 14 ene 2028**

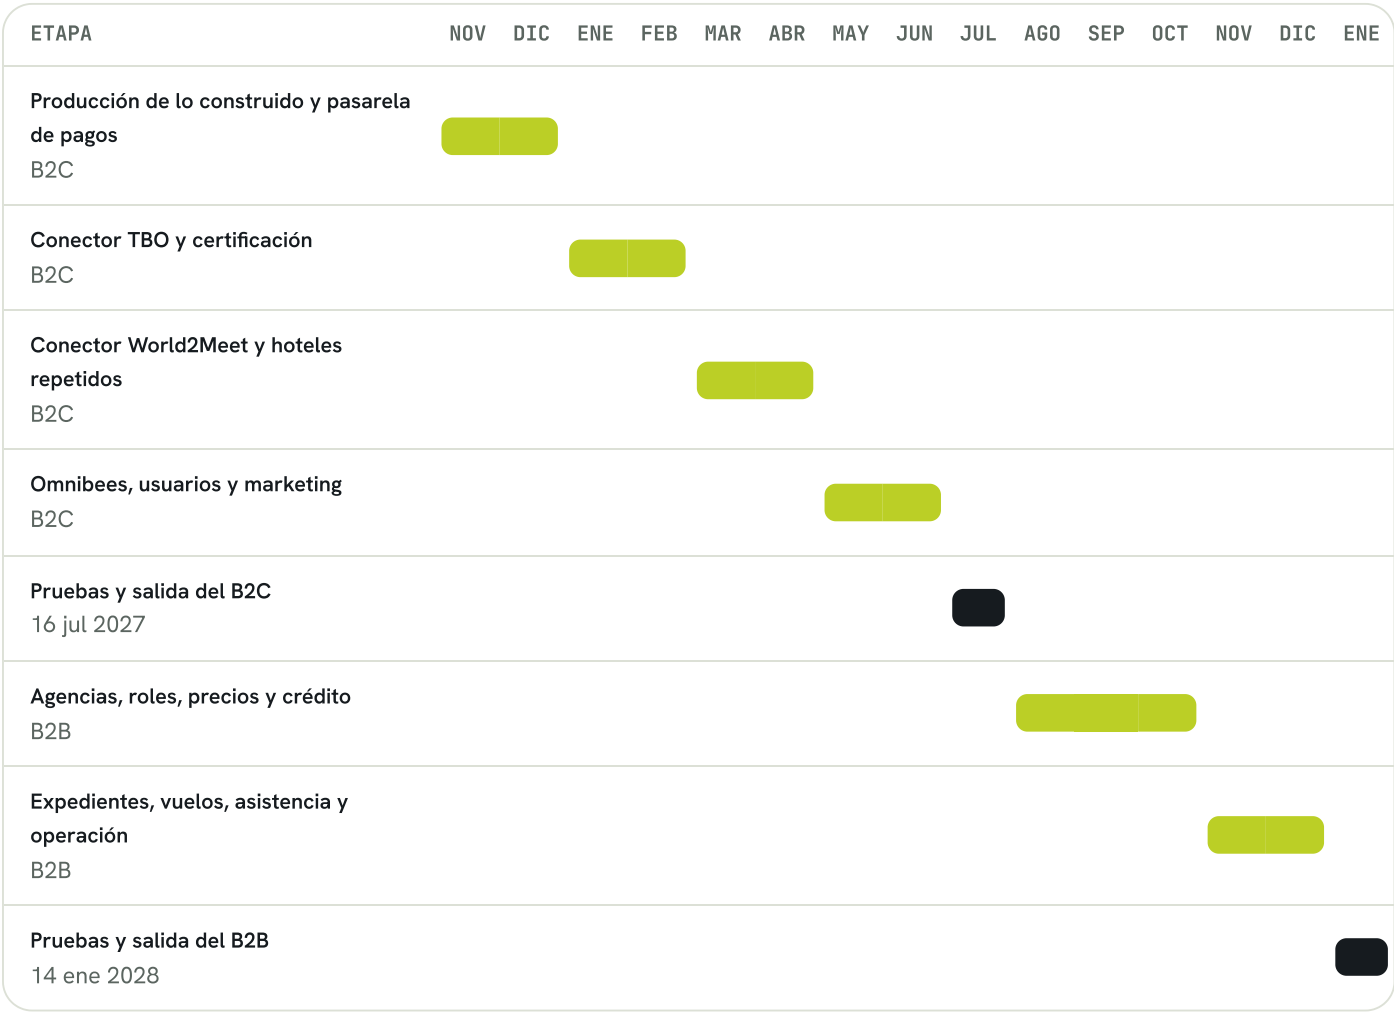

VIE 18 DIC 2026
Pagos en línea y producción de lo construido

VIE 26 FEB 2027
Hoteles y actividades de TBO

VIE 16 JUL 2027
B2C en producción

VIE 14 ENE 2028
B2B en producción

Cada mes cierra con una entrega que AVM puede probar en el sitio de prueba. Si AVM elige el camino 1, el B2C sale el 7 de mayo de 2027 con hoteles, vuelos y actividades de LiteAPI, y el B2B el 17 de marzo de 2028.

LO QUE PUEDE MOVER LAS FECHAS

Requisitos de AVM **y riesgos**

AVM entrega

1. **Acceso a la API de cada proveedor**
   Documentación y credenciales de prueba de TBO, World2Meet y Omnibees, a nombre de AVM, un mes antes de su etapa.
2. **Pasarela de pagos**
   Cuenta de Wompi, PayU o ePayco a nombre de AVM, aprobada antes del 4 de diciembre.
3. **Proveedor de asistencia médica**
   Con API, contrato y credenciales, para el B2B.
4. **Políticas y contenido**
   Términos de compra, cancelación y reembolso revisados por un abogado; tarifarios propios en PDF.
5. **Una persona de AVM para pruebas**
   Unas 2 horas por semana para probar cada entrega y responder dudas.

Riesgos

Certificación de proveedores
TBO, World2Meet y Omnibees revisan la integración antes de abrir producción. Puede tardar de 2 a 6 semanas por proveedor.

Un solo desarrollador
Una incapacidad o un imprevisto detiene el avance. El código queda en el repositorio de AVM, documentado.

Cambios de alcance
Un producto o un proveedor nuevo suma sus semanas; se acuerda por escrito antes de empezarlo.

Aprobación de pagos de LiteAPI
Solo en el camino 1: sin ella, el sitio cotiza pero no cobra las reservas de LiteAPI.

Fuera de alcance: facturación electrónica (DIAN), aplicación móvil, pauta y manejo de campañas, fotografía y textos de destinos, atención a clientes y a agencias, y la API de Travel Compositor.

INVERSIÓN

Una mensualidad **para ambos proyectos**

MENSUALIDAD DURANTE EL DESARROLLO

$4.500.000 COP mensuales

Cubre 20 horas semanales de desarrollo, pruebas, despliegues y reuniones de seguimiento, sea cual sea el proyecto en curso.

ESCENARIO	MESES	INVERSIÓN TOTAL
Solo B2C, camino 1	6	$27.000.000
Solo B2C, camino 2	8	$36.000.000
B2C camino 2 y luego B2B (recomendado)	14	$63.000.000

ESCENARIO	MESES	INVERSIÓN TOTAL
B2C camino 1 y luego B2B	16	$72.000.000

Después de cada salida a producción: soporte y mantenimiento opcional de $1.500.000 COP mensuales, hasta 15 horas: correcciones, actualizaciones, copias de seguridad y monitoreo del servidor.

Costos de terceros, a nombre de AVM: servidor (de 10 a 40 USD al mes), dominio, correos (Resend), comisiones de la pasarela por transacción, comisiones de LiteAPI y de los proveedores, y el presupuesto de pauta.

ACEPTACIÓN

Firma de **la propuesta**

1. AVM elige un escenario y lo marca abajo. El trabajo empieza el 9 de noviembre de 2026.
2. Las fechas suponen 20 horas semanales de desarrollo y que AVM entrega a tiempo los requisitos. Un retraso en esas entregas corre las fechas en el mismo tiempo.
3. La mensualidad se paga por mes vencido mientras dure el desarrollo. AVM puede detener el proyecto avisando con 30 días; lo construido hasta ese momento queda para AVM.
4. El código, los datos y las cuentas de los servicios quedan a nombre de AVM.
5. Cambios de alcance después de la firma se acuerdan por escrito, con su ajuste de tiempo y valor.

Escenario elegido: ☐ B2C camino 1 ☐ B2C camino 2 ☐ B2C camino 2 y B2B ☐ B2C camino 1 y B2B

Por AVM Operadores Mayoristas

Nombre:

C.C. / NIT:

Fecha:

Por el desarrollador

Nombre: **Santiago Martínez**

C.C. / NIT: **1.076.623.993**

Fecha: **9 de noviembre de 2026**
