Propuesta · 11 nov 2026

Dos plataformas para AVM: **sitio B2C y Travel Booking & Distribution**

Dos marcas, cada una con su propio sitio y su propio backoffice. Primero sale el **B2C**, que ya está avanzado, con LiteAPI. Después se construye el portal **B2B** para agencias con los proveedores de AVM. Al final, el B2C vende también con esos proveedores, como un modelo white label.

QUÉ SE ENTREGA

Dos proyectos, **cada uno con su marca**

Cada semana termina con un avance visible que AVM revisa en el sitio de prueba. Mientras se pule el B2C, la base del B2B avanza en paralelo.

B2C · MARCA PARA EL VIAJERO

- **Buscador con LiteAPI**
  Hoteles, vuelos y actividades. LiteAPI sigue como proveedor adicional cuando llegan los del B2B.
- **Reserva y pago en el sitio**
  Tarjeta crédito y débito, PSE y Nequi, con una semana de pruebas de la pasarela.
- **Registro de reservas y cotizaciones de los leads**

`Ya construido`

- **Cotizaciones y vouchers modernos**
  Enlace, PDF y WhatsApp; un voucher por viaje.
- **Backoffice propio**
  Diseño, banners, markup y fees, producto y tarifarios propios, desglose de cada venta.

`Ya construido`

- **SEO técnico por destino, Google Analytics 4 y Google Ads**
- **Automatizaciones**
  Recaptura de búsquedas y cotizaciones sin compra, campañas promocionales.
- **Identidad visual de la marca B2C**
- **Pruebas y salida a producción**

B2B · TRAVEL BOOKING & DISTRIBUTION

- **Plataforma y backoffice propios**
- **Registro de agencias**
  Solicitud, aprobación, usuarios y roles, y carga de la base de datos de AVM.
- **Precios por agencia, grupo, producto y proveedor**
- **Integración TBO** (hoteles)
- **Mapping: un solo catálogo**
  Cada hotel sale una vez, con el mejor precio entre proveedores.
- **Integración Omnibees** (hoteles)
- **Tercer proveedor de hoteles**
  El que AVM elija.
- **Producto propio**
  Hoteles, traslados, actividades y circuitos que AVM carga en el backoffice.
- **Integración de asistencia médica** (un proveedor)
- **Integración de actividades** (un proveedor)

`+1 mes`

- **Integración de vuelos** (un proveedor)

`+1 mes`

- **Pasarela de pagos**
  Tarjetas, billeteras virtuales y PSE, con una semana de pruebas.
- **Crédito de agencia**
- **Cotizaciones y vouchers modernos**

Con la marca de la agencia; un voucher por viaje.

- **Operación**
  Reservas, cancelaciones, reportes y conciliación con proveedores.

- **Pruebas con agencias piloto, capacitación y salida**

- **Integración con Dingus** (si AVM lo requiere)

`+1 mes`

En el B2B se integran 3 proveedores de hoteles, 1 de asistencia médica, 1 de actividades y 1 de vuelos. El cronograma incluye los 3 de hoteles y el de asistencia médica; actividades y vuelos toman 1 mes cada uno desde que AVM entrega sus credenciales de prueba. **En el B2C**, vuelos y actividades se venden a través de LiteAPI. **White label:** al terminar el B2B, el sitio B2C empieza a vender también con los proveedores del B2B.

HITOS

Las fechas **que importan**

`Vie 19 mar 2027`
B2C en producción
Con hoteles, vuelos y actividades de LiteAPI y pagos en línea.

`~ Vie 7 may 2027`
TBO conectado
Fecha estimada: depende de la certificación de TBO.

`~ Vie 18 jun 2027`
Omnibees conectado
Fecha estimada: depende del contrato y la certificación.

`~ Vie 16 jul 2027`
Tercer proveedor de hoteles conectado
Depende del proveedor que elija AVM.

`~ Vie 13 ago 2027`
Asistencia médica conectada
Depende del proveedor que elija AVM.

`Vie 22 oct 2027`

Travel Booking & Distribution en producción

Con las primeras agencias.

`Vie 12 nov 2027`


B2C con los proveedores del B2B

Modelo white label: ambos proyectos conectados.

Las fechas con ~ dependen de la certificación de cada proveedor.

CRONOGRAMA

17 nov 2026 a 12 nov 2027 · **52 semanas de desarrollo**

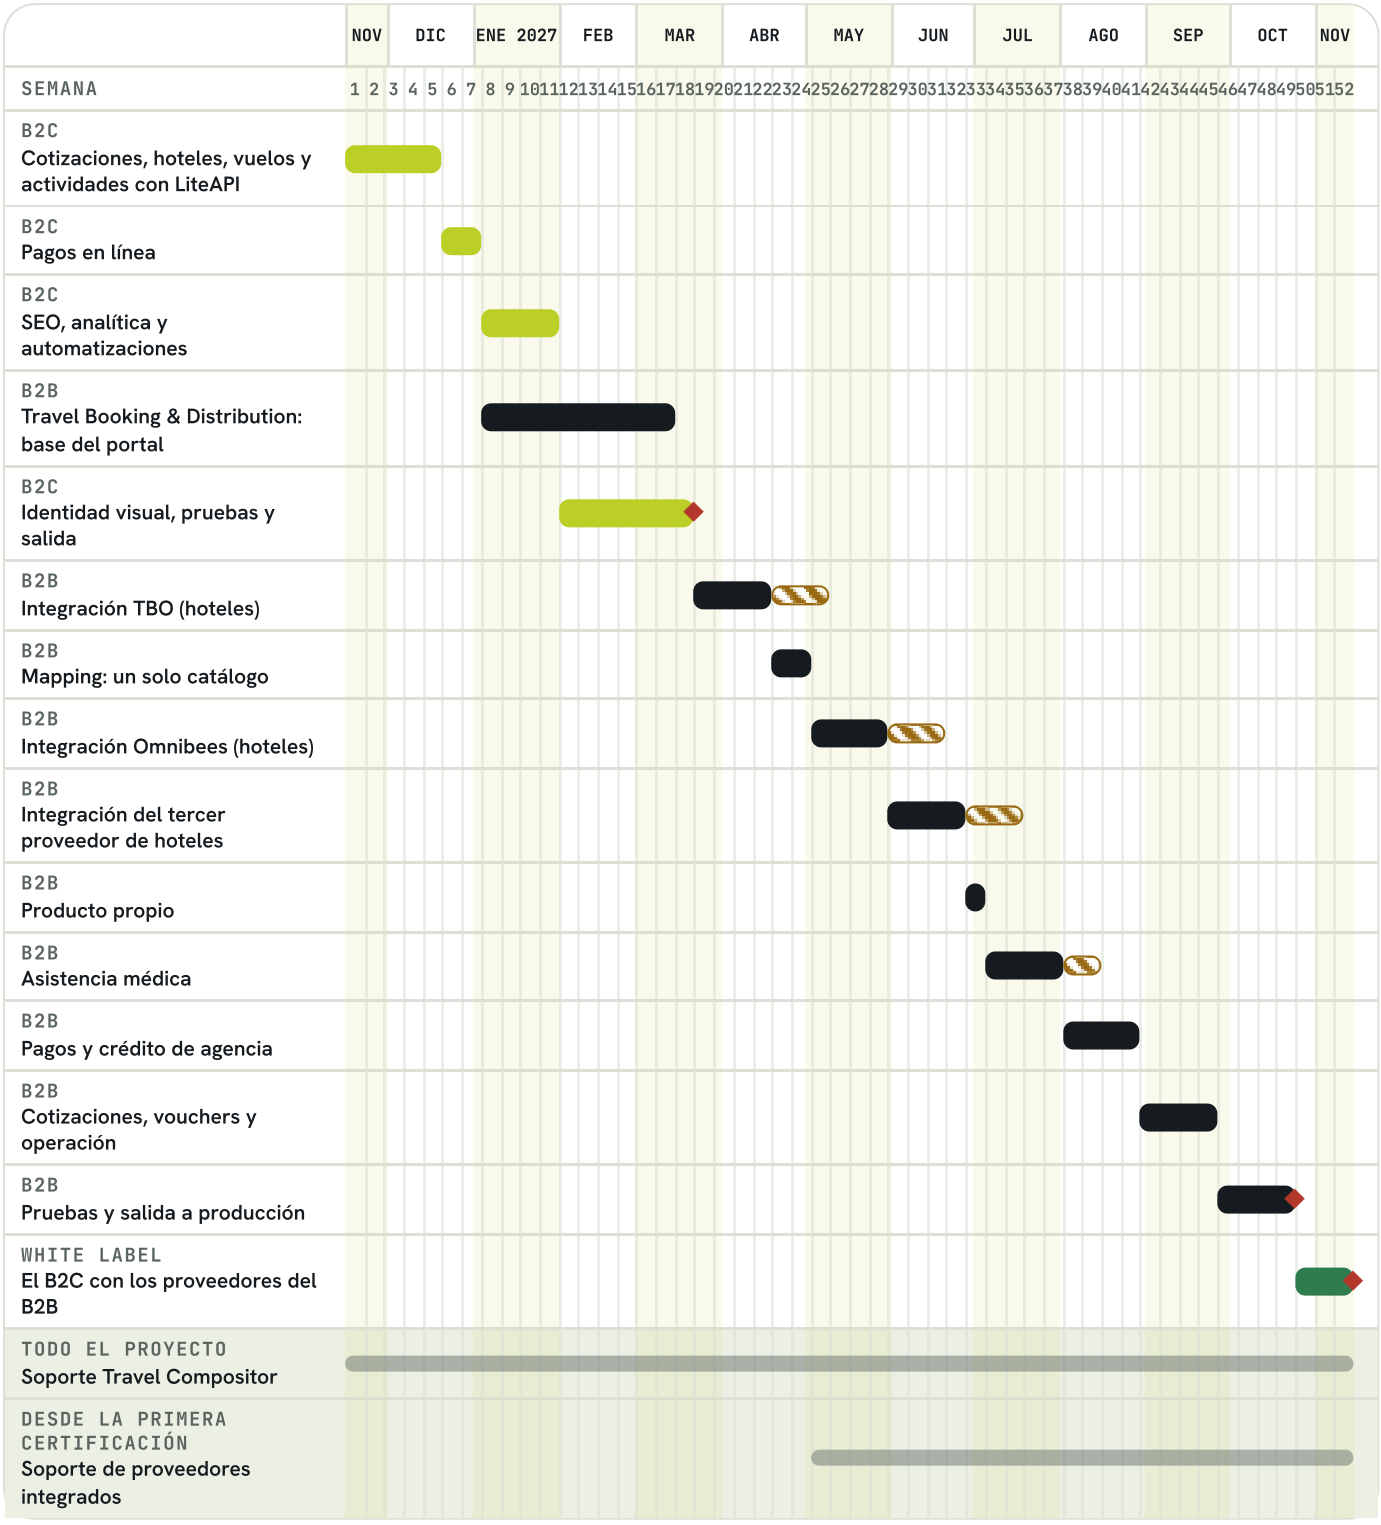

Durante todo el proyecto se mantiene el soporte de Travel Compositor que ya está acordado con AVM, y desde la primera certificación, el soporte de los proveedores integrados.

COMO SE INTEGRA CADA PROVEEDOR

Cuatro semanas de desarrollo **y la certificación del proveedor**

SEMANA 1

Conexión

Autenticación, catálogo, disponibilidad y tarifas.

SEMANAS 2 Y 3

Flujo de reserva

Verificación de precio, reserva, cancelación y voucher.

SEMANA 4

Pruebas

Pruebas, correcciones y envío a certificación.

~3 SEMANAS

Certificación

La revisa el proveedor. Mientras tanto se avanza con lo siguiente.

AL APROBAR


Producción

El proveedor queda activo para las agencias.

Las 4 semanas empiezan cuando AVM entrega el contrato de uso de la API firmado y las credenciales de prueba. La certificación depende de cada proveedor y de sus tiempos de aprobación; aquí se estima en 3 semanas. **Cada proveedor nuevo que AVM quiera sumar toma 1 mes adicional** desde la entrega de sus credenciales de prueba.

MAPPING

Por qué hay que mapear **antes de mezclar proveedores**

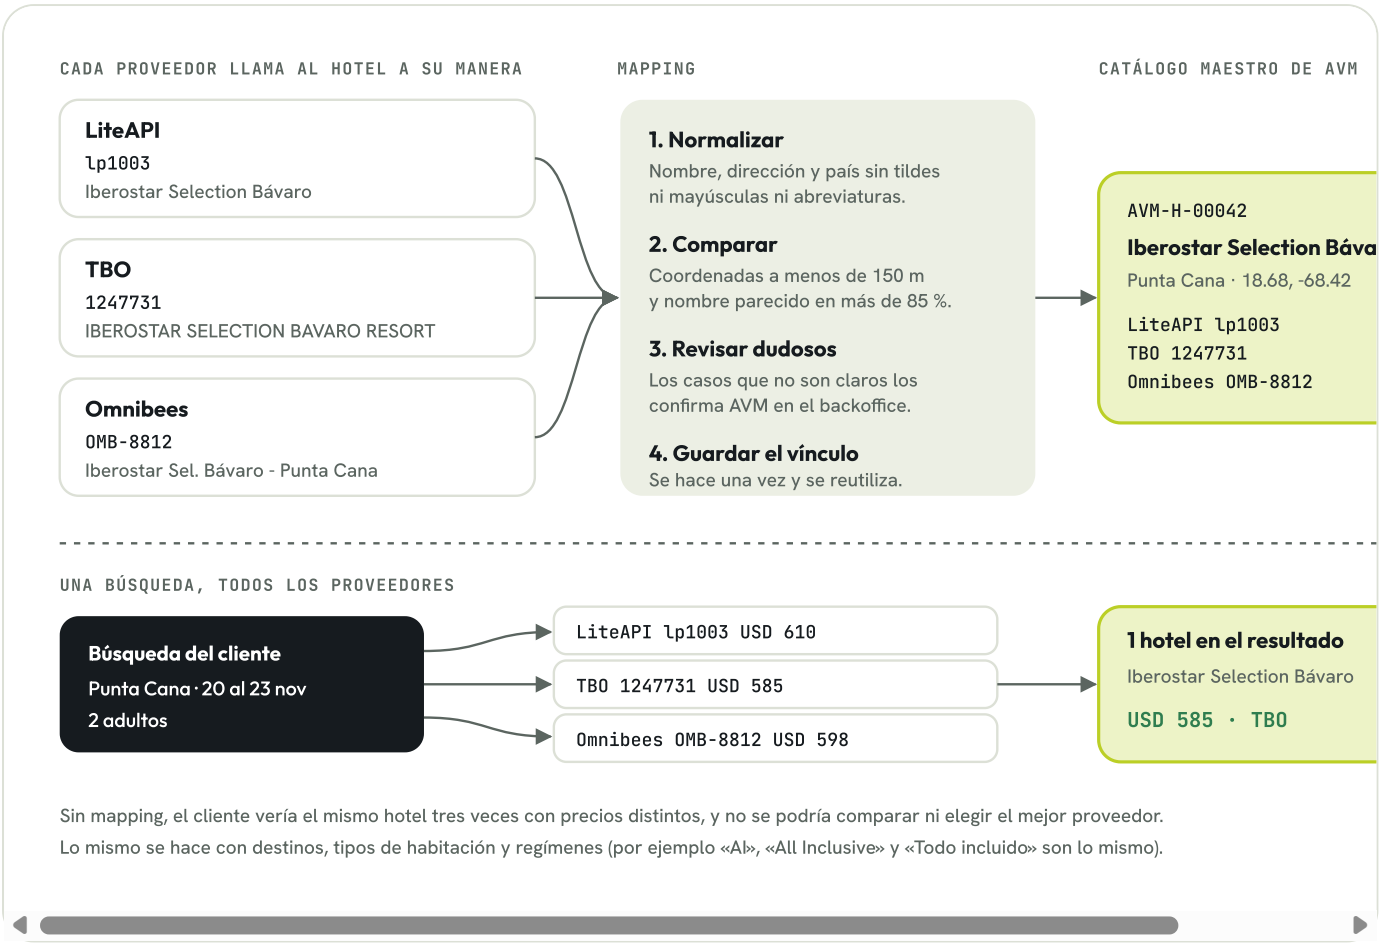

Sin mapping, el cliente vería el mismo hotel tres veces con precios distintos, y no se podría comparar ni elegir el mejor proveedor. Lo mismo se hace con destinos, tipos de habitación y regímenes (por ejemplo «AI», «All Inclusive» y «Todo incluido» son lo mismo).

Por qué es importante

- Cada proveedor usa su propio código y su propio nombre para el mismo hotel.
- Sin mapping, el mismo hotel sale repetido y no se pueden comparar precios.
- Con mapping, una sola búsqueda consulta a todos los proveedores y muestra el mejor precio.
- Es la base para que el B2C use después los proveedores del B2B sin rehacer nada.

Cómo queda desarrollado

- Un catálogo maestro de AVM con un código propio por destino y por hotel.
- Vinculación automática por coordenadas y nombre, y revisión manual de dudosos en el backoffice.
- Equivalencias de tipos de habitación y regímenes entre proveedores.
- Cada proveedor nuevo se mapea al catálogo maestro al integrarlo; los anteriores no se tocan.

PLAN DE TRABAJO

Semana a semana · **52 semanas**

SEM.	FECHAS	QUÉ SE ENTREGA
B2C · Cotizaciones, hoteles, vuelos y actividades con LiteAPI 17 nov 2026 – 18 dic 2026 · 5 semanas		
AVM	antes del 16 nov	Opcional: AVM empieza a construir la base de datos de agencias (nombre comercial, NIT, correo y teléfono) para la conciliación contable.
S01	17 nov – 20 nov	PDF de la cotización y del voucher de viaje, con el diseño moderno de la marca.
S02	23 nov – 27 nov	Reserva de hoteles con LiteAPI: verificación de precio, reserva y confirmación.
AVM	semana del 30 nov	AVM solicita a LiteAPI, con mi acompañamiento, la aprobación de pagos en producción y el acceso a Flights y Experiences.
S03	30 nov – 4 dic	Vuelos con LiteAPI: búsqueda, precios y resultados.
S04	7 dic – 11 dic	Vuelos con LiteAPI: datos de pasajeros, reserva y emisión.
S05	14 dic – 18 dic	Actividades con LiteAPI: búsqueda, precio y reserva.
B2C · Pagos en línea 21 dic 2026 – 1 ene 2027 · 2 semanas		
AVM	antes del 21 dic	Pasarela de pagos aprobada y lista para integrar (Wompi, PayU, ePayco u otra), a nombre de AVM.
S06	21 dic – 25 dic	Pasarela de pagos: tarjeta crédito y débito, PSE y Nequi, con confirmación automática.
S07	28 dic – 1 ene	Pasarela de pagos: semana de pruebas con pagos reales, reembolsos y conciliación.
B2C · SEO, analítica y automatizaciones 4 ene 2027 – 29 ene 2027 · 4 semanas		
B2B · Travel Booking & Distribution: base del portal 4 ene 2027 – 12 mar 2027 · 10 semanas		
S08	4 ene – 8 ene	B2C SEO técnico por destino (una sola configuración para todo el sitio), Google Analytics 4 y conversiones de Google Ads. (1.ª parte) B2B Plataforma B2B con su propia marca y su propio backoffice; usuarios del equipo de AVM. (1.ª parte)
S09	12 ene – 15 ene	B2C SEO técnico por destino (una sola configuración para todo el sitio), Google Analytics 4 y conversiones de Google Ads. (2.ª parte) B2B Plataforma B2B con su propia marca y su propio backoffice; usuarios del equipo de AVM. (2.ª parte)

SEM.	FECHAS	QUÉ SE ENTREGA
S10	18 ene – 22 ene	B2C Automatizaciones: ajustes finales a la recaptura de búsquedas y cotizaciones sin compra, y a las campañas promocionales. (1.ª parte) B2B Registro de agencias: solicitud con RNT y NIT, revisión y aprobación de AVM. (1.ª parte)
S11	25 ene – 29 ene	B2C Automatizaciones: ajustes finales a la recaptura de búsquedas y cotizaciones sin compra, y a las campañas promocionales. (2.ª parte) B2B Registro de agencias: solicitud con RNT y NIT, revisión y aprobación de AVM. (2.ª parte)
B2C · Identidad visual, pruebas y salida	1 feb 2027 – 19 mar 2027 · 7 semanas	
AVM	antes del 1 feb	AVM entrega la identidad visual de la marca B2C: logo, colores y tipografía.
S12	1 feb – 5 feb	B2C Identidad visual de la marca B2C aplicada a todo el sitio. (1.ª parte) B2B Usuarios por agencia con roles y carga de la base de datos de agencias de AVM. (1.ª parte)
S13	8 feb – 12 feb	B2C Identidad visual de la marca B2C aplicada a todo el sitio. (2.ª parte) B2B Usuarios por agencia con roles y carga de la base de datos de agencias de AVM. (2.ª parte)
S14	15 feb – 19 feb	B2C Pruebas de punta a punta con el equipo de AVM y correcciones. (1.ª parte) B2B Precios por agencia, grupo, producto y proveedor: reglas de markup y comisión. (1.ª parte)
S15	22 feb – 26 feb	B2C Pruebas de punta a punta con el equipo de AVM y correcciones. (2.ª parte) B2B Precios por agencia, grupo, producto y proveedor: reglas de markup y comisión. (2.ª parte)
S16	1 mar – 5 mar	B2C Pruebas finales, correcciones y revisión de seguridad. (1.ª parte) B2B Precios: prioridad de reglas y simulador del precio final. (1.ª parte)
S17	8 mar – 12 mar	B2C Pruebas finales, correcciones y revisión de seguridad. (2.ª parte) B2B Precios: prioridad de reglas y simulador del precio final. (2.ª parte)
S18	15 mar – 19 mar	**Salida a producción del sitio B2C (requiere la aprobación de LiteAPI en producción).**
B2B · Integración TBO (hoteles)	23 mar 2027 – 16 abr 2027 · 4 semanas	
AVM	antes del 22 mar	Contrato de uso de API con TBO firmado y credenciales de prueba entregadas.
S19	23 mar – 26 mar	TBO: conexión, autenticación, catálogo, disponibilidad y tarifas.
S20	29 mar – 2 abr	TBO: flujo de reserva (verificación de precio, datos de pasajeros y reserva).
S21	5 abr – 9 abr	TBO: cancelación, voucher del proveedor y registro en el expediente.
S22	12 abr – 16 abr	TBO: pruebas, correcciones y envío a certificación.

SEM.	FECHAS	QUÉ SE ENTREGA
⧗	*19 abr – 7 may*	*Certificación de TBO: revisión del proveedor, en paralelo con lo siguiente. Estimado: 3 semanas.*
B2B · Mapping: un solo catálogo 19 abr 2027 – 30 abr 2027 · 2 semanas		
S23	19 abr – 23 abr	Mapping: catálogo maestro de destinos y hoteles con LiteAPI y TBO.
S24	26 abr – 30 abr	Mapping: habitaciones y regímenes, mejor precio y revisión manual de dudosos en el backoffice.
B2B · Integración Omnibees (hoteles) 3 may 2027 – 28 may 2027 · 4 semanas		
AVM	antes del 3 may	Contrato de uso de API con Omnibees firmado y credenciales de prueba entregadas.
S25	3 may – 7 may	Omnibees: conexión, autenticación, catálogo, disponibilidad y tarifas.
S26	11 may – 14 may	Omnibees: flujo de reserva (verificación de precio, datos de pasajeros y reserva).
S27	17 may – 21 may	Omnibees: cancelación, voucher del proveedor y registro en el expediente.
S28	24 may – 28 may	Omnibees: pruebas, correcciones y envío a certificación.
⧗	*31 may – 18 jun*	*Certificación de Omnibees: revisión del proveedor, en paralelo con lo siguiente. Estimado: 3 semanas.*
B2B · Integración del tercer proveedor de hoteles 1 jun 2027 – 25 jun 2027 · 4 semanas		
AVM	antes del 31 may	Tercer proveedor de hoteles elegido, con contrato de uso de API firmado y credenciales de prueba entregadas.
S29	1 jun – 4 jun	Tercer proveedor de hoteles: conexión, autenticación, catálogo, disponibilidad y tarifas.
S30	8 jun – 11 jun	Tercer proveedor de hoteles: flujo de reserva y mapping al catálogo maestro.
S31	14 jun – 18 jun	Tercer proveedor de hoteles: cancelación, voucher del proveedor y registro en el expediente.
S32	21 jun – 25 jun	Tercer proveedor de hoteles: pruebas, correcciones y envío a certificación.
⧗	*28 jun – 16 jul*	*Certificación de Hoteles 3: revisión del proveedor, en paralelo con lo siguiente. Estimado: 3 semanas.*
B2B · Producto propio 28 jun 2027 – 2 jul 2027 · 1 semana		
AVM	antes del 28 jun	AVM tiene listo el catálogo completo de producto propio que va a cargar: hoteles, traslados, actividades y circuitos, con tarifas y temporadas.
S33	28 jun – 2 jul	Producto propio en el B2B: carga del catálogo de AVM, temporadas, cupos y precios por agencia.

SEM.	FECHAS	QUÉ SE ENTREGA
B2B · Asistencia médica 6 jul 2027 – 30 jul 2027 · 4 semanas		
AVM	antes del 5 jul	Proveedor de asistencia médica elegido, con acuerdo firmado y credenciales de prueba.
S34	6 jul – 9 jul	Asistencia médica: conexión, autenticación, planes y tarifas.
S35	12 jul – 16 jul	Asistencia médica: cotización por días, edades y destino.
S36	19 jul – 23 jul	Asistencia médica: emisión, cancelación y voucher dentro del expediente.
S37	26 jul – 30 jul	Asistencia médica: pruebas, correcciones y envío a certificación.
⧗	*2 ago – 13 ago*	*Certificación de Asistencia médica: revisión del proveedor, en paralelo con lo siguiente. Estimado: 2 semanas.*
B2B · Pagos y crédito de agencia 2 ago 2027 – 27 ago 2027 · 4 semanas		
AVM	antes del 2 ago	Pasarela de pagos del B2B aprobada y lista para integrar, a nombre de AVM.
S38	2 ago – 6 ago	Pasarela de pagos B2B: tarjeta crédito y débito, billeteras virtuales y PSE.
S39	9 ago – 13 ago	Pasarela de pagos B2B: semana de pruebas con pagos reales, reembolsos y conciliación.
S40	17 ago – 20 ago	Crédito de agencia: cupo o saldo prepagado, reservas contra el cupo y movimientos.
S41	23 ago – 27 ago	Crédito de agencia: estado de cuenta, abonos, alertas y bloqueo por mora.
B2B · Cotizaciones, vouchers y operación 30 ago 2027 – 24 sep 2027 · 4 semanas		
S42	30 ago – 3 sep	Cotizaciones y vouchers modernos con la marca de cada agencia: enlace, PDF y WhatsApp; un voucher por viaje.
S43	6 sep – 10 sep	Operación: reservas y cancelaciones por agencia en el backoffice.
S44	13 sep – 17 sep	Operación: reportes de ventas por agencia, proveedor y producto.
S45	20 sep – 24 sep	Operación: conciliación con proveedores y registro contable de ventas por agencia.
B2B · Pruebas y salida a producción 27 sep 2027 – 22 oct 2027 · 4 semanas		
AVM	antes del 27 sep	AVM elige 2 o 3 agencias piloto.
S46	27 sep – 1 oct	Pruebas con agencias piloto y correcciones.
S47	4 oct – 8 oct	Pruebas finales con agencias piloto, correcciones y revisión de seguridad.
S48	11 oct – 15 oct	Capacitación del equipo de AVM y manual de uso.
S49	19 oct – 22 oct	**Salida a producción de Travel Booking & Distribution con las primeras agencias.**

SEM.	FECHAS	QUÉ SE ENTREGA
White label · El B2C con los proveedores del B2B 25 oct 2027 – 12 nov 2027 · 3 semanas		
S50	25 oct – 29 oct	El sitio B2C consulta los proveedores del B2B a través del catálogo común.
S51	2 nov – 5 nov	Precios del B2C sobre el neto de cada proveedor, con el markup de la marca B2C.
S52	8 nov – 12 nov	**Pruebas y salida: el B2C vende con LiteAPI y con los proveedores del B2B.**

Las filas **AVM** son responsabilidades de AVM que deben estar listas antes de esa semana; si llegan tarde, la etapa se corre el mismo tiempo. Las semanas marcadas B2C y B2B avanzan en paralelo. Las filas marcadas como opcionales no mueven las fechas. Los festivos de lunes ya están descontados.

LO QUE MUEVE LAS FECHAS

Responsabilidades de AVM **y riesgos**

AVM entrega

1. **Una persona designada para decidir**
   Con autoridad para aprobar los entregables y tomar las decisiones importantes: modelo de voucher, módulo de administración, UX/UI del sitio.
2. **Base de datos de agencias**
   Nombre comercial, NIT, correo y teléfono de cada agencia, para registrar sus ventas y la conciliación contable. Desde ya.
3. **Aprobación de LiteAPI**
   Pagos en producción y acceso a Flights y Experiences. Sin ella, el B2C no sale a producción.
4. **Pasarela de pagos aprobada antes de su semana**
   La que AVM elija, a nombre de AVM, lista para integrar antes de que empiece la semana de integración, tanto en el B2C como en el B2B.
5. **Contrato de uso de API con cada proveedor**
   Firmado, con credenciales de prueba, antes de su integración: 3 de hoteles, asistencia médica, actividades y vuelos. Con Omnibees aún no hay contacto ni contrato.
6. **Tercer proveedor de hoteles, asistencia médica, actividades y vuelos**
   Proveedor elegido y acuerdo firmado antes de su integración.
7. **Catálogo de producto propio**
   Completo, con tarifas y temporadas, antes de su semana de carga en el B2B.
8. **Identidad visual de la marca B2C**
   Logo, colores y tipografía antes de su semana.

Riesgos

> **Certificación de proveedores**
> Cada proveedor revisa la integración antes de abrir producción; puede tardar de 2 a 6 semanas. Mientras tanto se avanza con la fase siguiente.

> **Cambios de alcance**
> Un proveedor o un producto nuevo suma sus semanas y se acuerda por escrito antes de empezarlo.

Fuera de alcance

- Pauta publicitaria y manejo de campañas.
- Integración con sistemas contables.
- Aplicación para celulares.
- Fotografías y textos de destinos.
- Soporte a las agencias.
- Atención al cliente directo del canal B2C: AVM debe destinar una persona para esto.

9 Pruebas

2 o 3 agencias piloto para las pruebas del B2B.

INVERSIÓN

12 meses · **una mensualidad**

MENSUALIDAD DURANTE EL DESARROLLO

$3.500.000 COP mensuales · 12 meses

Del 17 de noviembre de 2026 al 12 nov 2027. Cubre el desarrollo, las pruebas, los despliegues y reuniones de seguimiento de ambos proyectos.

Proveedores adicionales (por ejemplo Dingus): 1 mes adicional cada uno, desde la entrega de sus credenciales de prueba.

COSTOS ASOCIADOS

Costos de terceros, **a nombre de AVM**

Servidor (de 10 a 40 USD al mes), dominio, correos (Resend), comisiones de la pasarela por transacción, de los proveedores y de LiteAPI, y el presupuesto de pauta.

ACEPTACIÓN

Firma de **la propuesta**

1. Las partes aceptan el alcance, el plan de trabajo y lo que queda fuera de alcance, tal como están descritos en esta propuesta.
2. Las fechas suponen que AVM cumple a tiempo sus responsabilidades. Un retraso en ellas, o en la certificación de un proveedor, corre las fechas en el mismo tiempo.
3. Cambios de alcance después de la firma se acuerdan por escrito, con su ajuste de tiempo y valor.

Por AVM Operadores Mayoristas

Nombre:

C.C. / NIT:

Fecha:

Por el desarrollador

Nombre: **Santiago Martínez**

C.C. / NIT: **1.076.623.993**

Fecha: **11 de noviembre de 2026**
